



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 – 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:KA393 ACTA DE ENTREGA CUENTA CON 5 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No PAGINA
NOMBRES Y FIRMAS	2, 5 Y 6.

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

**Dirección De Obra, Ordenamiento
Territorial Y Servicios Municipales**

Tec: Liliana Vianey León López

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Numero de acta:	Fecha:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 30 NOVIEMBRE DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO

PROYECTO: KA383, KA384, KA385, KA386, KA387, KA388, KA389, KA390, KA391, KA392, KA393, KA394. DESCRIPCIÓN: DE CUARTO

LOCALIDAD: 270140013.- RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE), 270140039.- RA. MONTE ADENTRO, 270140035.- RA. NICOLAS BRAVO 2DA. SECC., 270140026.- RA. POTRERITOS. MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

PROGRAMA: K022.-INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA. SUB-PROGRAMA: OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICACIONES HABITACIONALES

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): 1,380,667.80

META: 15 CUARTOS PLAZO DE EJECUCIÓN: 60

UNIDAD: PZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 26 DE NOVIEMBRE 2022

TERMINO DE OBRA ANTICIPADO :


POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 FAMILIAS

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S.A. DE C.V. R.F.C.: CTA200129B59

DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL NACAJUCA A VILLAHERMOSA KM, SALOYA 2DA SECCION, NACAJUCA, TABASCO, C.P. 86247 CONTRATO: CONT-DOOTSM-PA-026/2022

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. PALOMA ALVAREZ DIAZ



RESIDENTE DE OBRA: ARQ. PATRICIA GERONIMO TORRES

FECHA DE CONTRATO: 01/08/2022 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,311,375.44 ANTICIPO: \$ 393,412.63



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



IMPORTE DE AMPLIACION: _____ IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 1,311,292.28

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 1-ago-2022 INICIO DE OBRA (CONTRATO): 28-sep-2022

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 26-nov-2022

TERMINO DE OBRA ANTICIPADA

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 3771-04572-0 IMPORTE: \$393,412.63 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 3771-04573-9 IMPORTE: \$ 131,137.54 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: KA383,KA384, KA385,KA386, KA387,KA388, KA389,KA390, KA391,KA392, KA393,KA394. DESCRIPCIÓN: KA383,KA384,KA385,KA386,KA387,KA388,KA389,KA390, KA391,KA392,KA393,KA394.-CONSTRUCCION DE CUARTO

270140013.- RA. JOSE MARIA MORELOS Y FAVON (EL BELLOTE).,270140039.- RA. MONTE ADENTRO.,270140035.- RA. NICOLAS BRAVO 2DA. SECC.,270140026.- RA. POTRERITOS.
270140001.- CIUDAD, PARAISO.,270140011.- RA. FRANCISCO L. MADERO 2DA. SECCION.
270140010.- RA. LAS FLORES 2DA. SECC.,270140046.- EJ. CHILTEPEC.,270140014.- RA. LIBERTAD 1 RA SECC.,270140021.- RA. MOCTEZUMA 2DA. SECC.,270140006.- VILLA PUERTO CEIBA.,270140005.- EJIDO VILLA PUERTO CEIBA (CARRIZAL) MUNICIPIO PARAISO.

LOCALIDAD: MUNICIPIO PARAÍSO, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 15.00 CANTIDAD: 15 CUARTOS UNIDAD: PZA

PERIODO DE EJECUCION REAL: INICIO DE OBRA REAL: 28-sep-22 TERMINO DE OBRA REAL ANTICIPADO: 26-nov-22

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLAN.

No. De Oficio: ACTA DEL CABILDO No. 20, NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO Fecha: 01/08/2022 Inversión (\$): \$ 1,380,687.80

INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIONES KA383,KA384, KA385,KA386, KA387,KA388, KA389,KA390,KA391,KA392,KA393,KA394.

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO		TOTAL DE DEDUCCIONES
			ESTIMADO	ACUMULADO	
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE OCTUBRE 2022	28-sep-22 AL 30-sep-22	\$ 4,109.53	\$ 4,109.53	\$ 28.77
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22 AL 31-oct-22	\$ 5,682.02	\$ 9,791.55	\$ 39.77
ESTIMACION No.03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS.	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22 AL 31-oct-22	\$ 10,043.83	\$ 19,835.38	\$ 70.31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ESTIMACION No. 04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS. CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTO NO PREVISTOS.	01 DE DICIEMBRE 2022	01-nov-22	AL	26-nov-22	\$ 67,585.00	\$ 87,420.38	\$ 473.10
							\$ 611.94
ESTIMACIONES KA391							
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE OCTUBRE 2022	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 2,863.91	\$ 2,863.91	\$ 20.05
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 26,510.76	\$ 29,374.67	\$ 185.58
ESTIMACION No.03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS.	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 29,217.89	\$ 58,592.56	\$ 204.53
ESTIMACION No. 04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS. CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTO NO PREVISTOS.	01 DE DICIEMBRE 2022	01-nov-22	AL	26-nov-22	\$ 203,646.80	\$ 262,239.37	\$ 1,425.53
							\$ 1,835.68
ESTIMACIONES KA394							
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE OCTUBRE 2022	28-sep-22	AL	30-sep-22	\$ 1,909.28	\$ 1,909.28	\$ 13.36
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 17,673.83	\$ 19,583.11	\$ 123.72
ESTIMACION No.03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS.	05 DE NOVIEMBRE 2022	01-oct-22	AL	31-oct-22	\$ 14,278.81	\$ 33,861.92	\$ 99.95
ESTIMACION No. 04 (CUATRO FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS. CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTO NO PREVISTOS.	01 DE DICIEMBRE 2022	01-nov-22	AL	26-nov-22	\$ 140,987.27	\$ 174,849.19	\$ 986.91
							\$ 1,223.94

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 1,311,292.28

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 3,671.56

SALDO DE AMPLIACION DE MONTO: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO.

HACE ENTREGA A: A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

DEPENDENCIA: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS LARA GIORGANA

LICITANTE: CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. PALOMA ALVARES DIAZ.

RECIBE DE CONFORMIDAD COMITÉ (X)


DEPENDENCIA: (X)

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PROPIETARIOS

Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

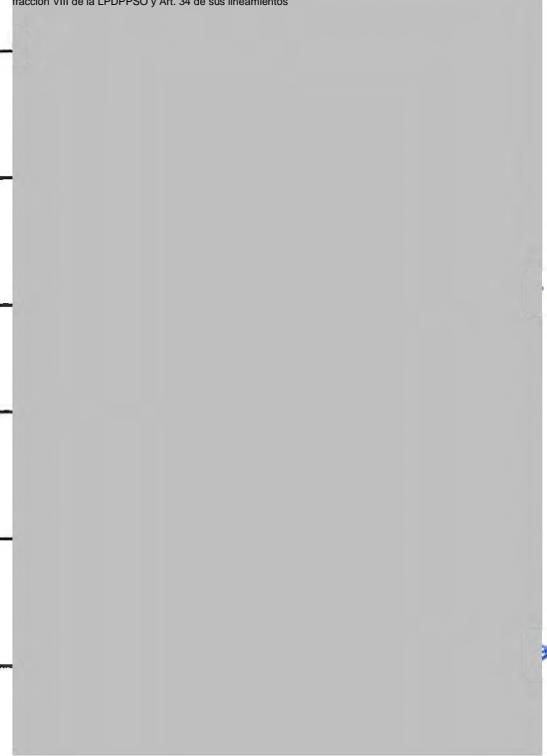



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PARAÍSO, TABASCO

2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

Información confidencial.Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus lineamientos

COORDINACIÓN DE DELEGADOS



COORDINADOR DE DELEGADOS

ING. JESUS RERAN MARTINEZ MAG

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAÍSO, TABASCO 2021-2024

POR LA DOOTSM

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: TÉC. ALEJANDRO RAMÓN LARA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO: LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTO. PEDRO RENE CONCEPCION ARTEAGA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APR EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SERVICIOS RELACI MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____
